


NIBRA® -Dachziegel-Bestellung: Mansard- und Schleppdachziegel

Maximal produzierbare Gesamtlänge für alle Modelle

(ausser G 10- "NEU") = 500 mm

Lieferanschrift für Vorab-Muster: _____

Bauvorhaben: _____

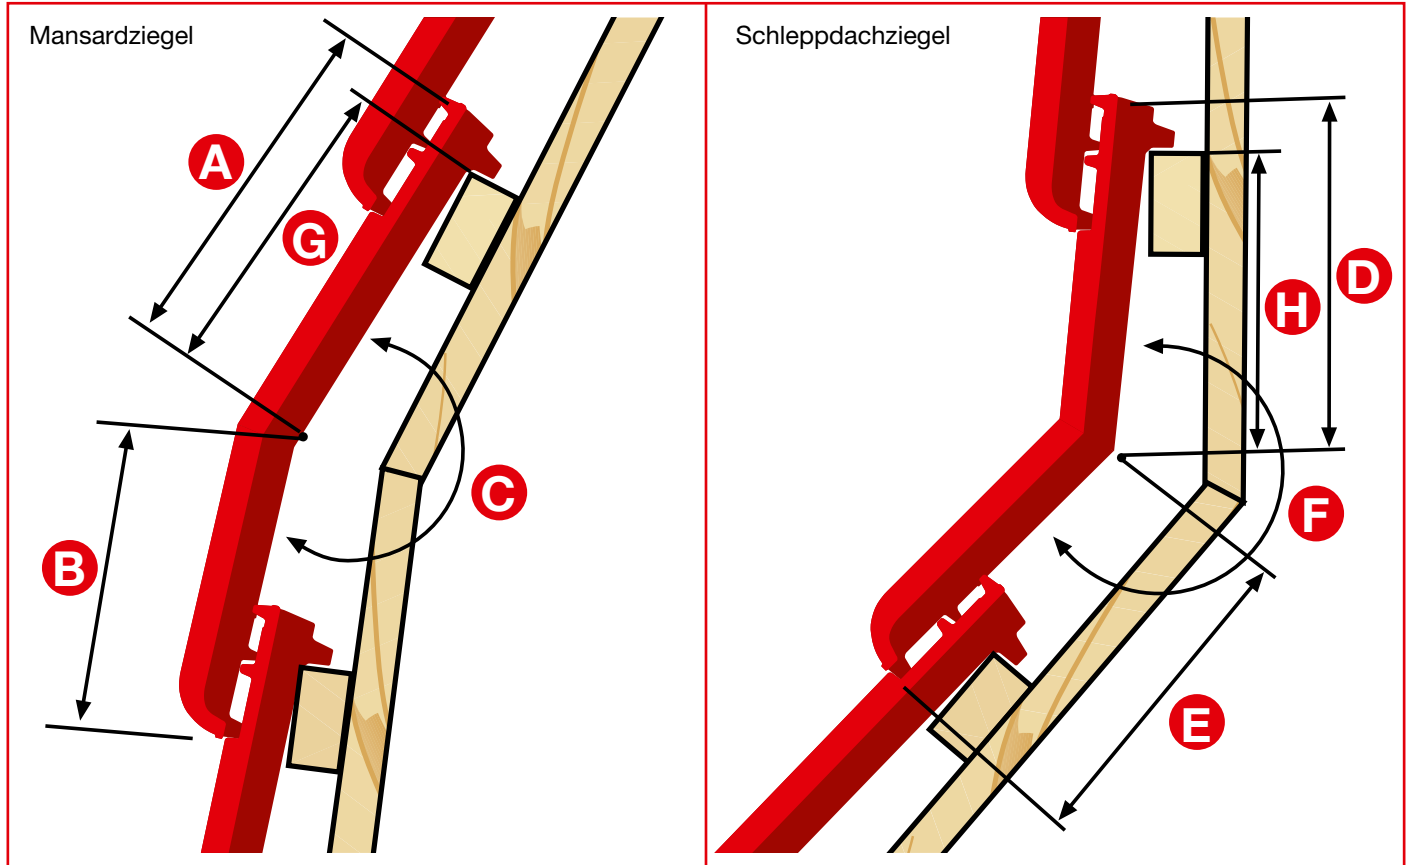

Maßangaben vom Kunden:

Modell:

A = _____ mm

B = _____ mm

G = _____ mm

C = _____ °

Maßangaben vom Kunden:

Modell:

D = _____ mm

E = _____ mm

H = _____ mm

F = _____ °

Mansard- und Schleppdachziegel werden individuell nach Ihren Maßangaben aus zwei Flächen-Ziegeln gefertigt. Angaben zur Dachneigung, Lattung und Schenkellängen sind die Basis der Produktion. Die Ziegel werden entsprechend der Dachneigung zugeschnitten, anschließend mit 2-Komponenten Epoxydharzkleber verbunden und in der gewünschten Farbe produziert. Zur Abstimmung erhalten Sie einen Musterziegel. Nach Freigabe ohne oder mit Korrekturen informieren wir Sie über den Liefertermin.

Freigabe Vorab-Muster erteilt: _____

Korrekturen: _____

Richtig Maßnahmen:

Die meisten notwendigen Maßangaben entsprechen Ihrer Erfahrung aus dem Arbeitsalltag.

Besonders hinweisen möchten wir auf folgende Maßangaben:

(A): gemessen wird von der Oberseite des Ziegels bis in die Wasserverfaltung im Knick. Maß (H) und (G) werden gemessen von der Oberseite der Lattung bis in die Seitenverfaltung im Knick. Maß (B) wird gemessen vom Wasserfalz bis zur Ziegel-Unterkante.
