


# Dachstein-Bestellung: Mansard- und Schleppdachstein

(Maximal produzierbare Gesamtlänge für alle  
Dachstein-Modelle = 450 mm)

Lieferanschrift für Vorab-Muster: \_\_\_\_\_

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

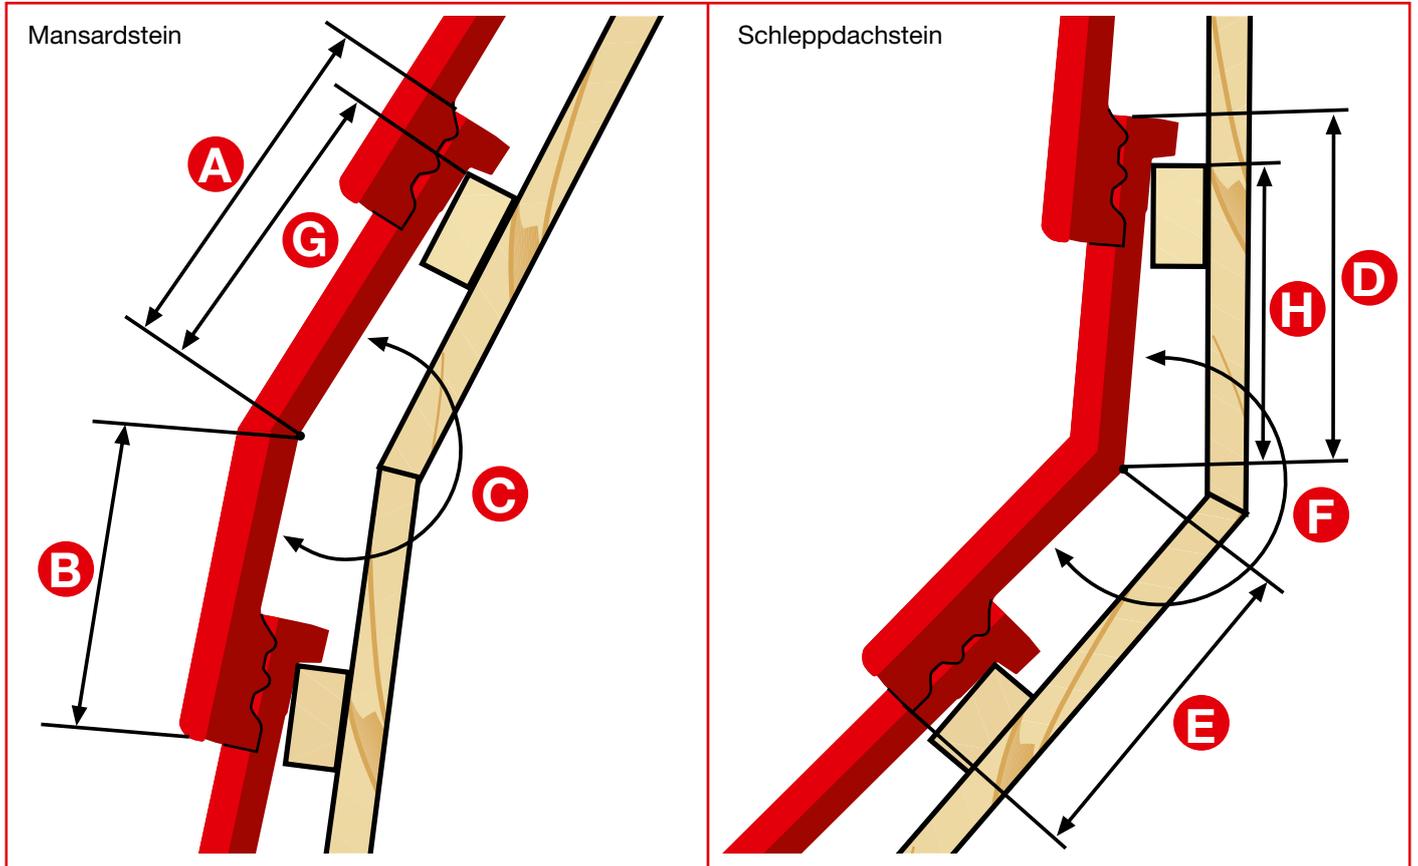

## Maßangaben vom Kunden:

### Modell:

A = \_\_\_\_\_ mm

B = \_\_\_\_\_ mm

G = \_\_\_\_\_ mm

C = \_\_\_\_\_ °

## Maßangaben vom Kunden:

### Modell:

D = \_\_\_\_\_ mm

E = \_\_\_\_\_ mm

H = \_\_\_\_\_ mm

F = \_\_\_\_\_ °

Mansard- und Schleppdachsteine werden individuell nach Ihren Maßangaben aus zwei Flächen-Dachsteinen gefertigt. Angaben zur Dachneigung, Lattung und Schenkellängen sind die Basis der Produktion. Die Dachsteine werden entsprechend der Dachneigung zugeschnitten, anschließend mit 2-Komponenten Epoxydharzkleber verbunden und in der gewünschten Farbe produziert. Zur Abstimmung erhalten Sie einen Musterdachstein. Nach Freigabe ohne oder mit Korrekturen informieren wir Sie über den Liefertermin. **Hinweis: Werkseitig ist kein Bohrloch vorhanden.**

Freigabe Vorab-Muster erteilt: \_\_\_\_\_

Korrekturen: \_\_\_\_\_

### Richtig Maßnahmen:

Die meisten notwendigen Maßangaben entsprechen Ihrer Erfahrung aus dem Arbeitsalltag.

Besonders hinweisen möchten wir auf folgende Maßangaben:

(A): gemessen wird von der Oberseite des Dachsteins bis in die Wasserverfaltung im Knick. Maß (H) und (G) wird gemessen von der Oberseite der Lattung bis in die Seitenverfaltung im Knick. Maß (B) wird gemessen vom Wasserfalz bis zur Dachstein-Unterkante.
